

דין וחשבון על בדיקה מס' 7311506593

## פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אינופרו פתרונות טכנולוגיים חדשניים בע"מ
מענו :	ת.ד. 265 משמרת 40695
תאריך ההזמנה :	15/02/2023
מס' הסכם :	3000071302

## דין וחשבון על מוצר

עוגן חורף מכונה על ידי המזמין INNO FIX EXTREME. סימון : (מ"מ) SSW 10/90 , שקובעו בקטע לדוגמה לתשתית בטון. פרויקט : רח' סוקולוב 37 הרצליה.
--

## פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך :	02/03/2023
מקומות הבדיקה נבחרו על ידי בא כח : המזמין	גודל המדגם : לבקשת המזמין 3 בורגי עיגון.

## מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין , בדיקת כח השליפה עד הכשל ב KGF של הברגים הנ"ל מהתשתית.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.
--	---	---

## תוצאות הבדיקה

כללי : א. בורגי העיגון שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין . ב. הבדיקה בוצעה עם ג'יק הידראולי בעל כושר העמסה מקסימלי של 12 טון, ראה תעודת כיוול 7222302514 דף מס' 1-3. תוצאות הבדיקות ראה בדף מס' 2.
---

שם החותם : מהנדס יוסף קובטי  
תפקידו : מהנדס ראשי  
מהנדס יוסף קובטי  
מהנדס ראשי - אגף בניין  
מכון התקנים הישראלי

שם הבודק : הנדסאי אלכסנדר ג'כטמן  
תפקידו : טכנאי בודק  
תאריך : 03/04/2023  
סכנאי אלכסנדר ג'כטמן  
ענף איכות תבנית  
מכון התקנים הישראלי

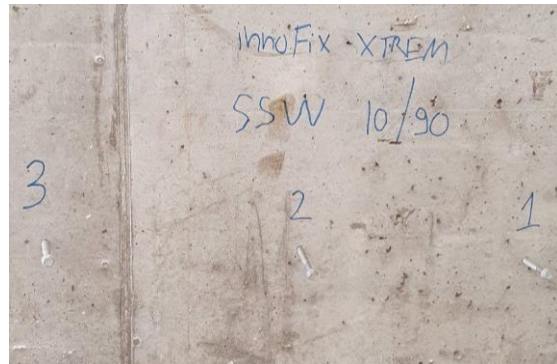
דין וחשבון על בדיקה מס' 7311506593

דף 2 מתוך 2 דפים

**תוצאות הבדיקה**

הערות	כוח מקס' מופעל ב- KGF	מס' בורג	האלמנט הנבדק
נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 3,070	1	קטע קיר בטון לדוגמא רמפה כניסה לחניון
נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 3,033	2	
נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 3,125	3	

שם הבודק: הנדסאי אלכסנדר גכטמן  
תפקידו: טכנאי בודק  
תאריך: 14/03/2023

**תמונה של עוגן הנבדק**

-----סוף דיווח-----
