

דין וחשבון על בדיקה מס' 7311508660

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אינופרו פתרונות טכנולוגיים חדשניים בע"מ
מענו	: ת.ד. 265 משמרת 40695
תאריך ההזמנה	: 15/02/2023
מס' הסכם	: 3000071302

דין וחשבון על מוצר

עוגן חורץ מכונה על ידי המזמין INNO FIX EXTREME. סימון: (מ"מ) SSW 7.5/60, שקובעו בקטע לדוגמה לתשתית בטון. פרויקט: רח' סוקולוב 37 הרצליה.
--

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 02/03/2023	מקומות הבדיקה נבחרו על ידי בא כח: המזמין
גודל המדגם: לבקשת המזמין 5 בורגי עיגון.	

מהות הבדיקה

בדיקת כח השליפה עד KGF 1500 של הברגים הנ"ל מהתשתית לפי בקשת נציג המזמין.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.
--	---	---

תוצאות הבדיקה

כללי:
א. בורגי העיגון שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין.
ב. הבדיקה בוצעה עם ג'ק הידראולי בעל כושר העמסה מקסימלי של 12 טון, ראה תעודת כוול 7222302514 דף מס' 1-3.
תוצאות הבדיקות ראה בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס יוסף קובטי
תפקידו: מהנדס ראשי

מהנדס יוסף קובטי
מהנדס ראשי אגף בנין
מכון התקנים הישראלי

שם הבודק: הנדסאי אלכסנדר ג'סטמן
תפקידו: טכנאי בודק
תאריך: 03/04/2023

טכנאי אלכסנדר ג'סטמן
ענף איכות הבניה
מכון התקנים הישראלי

דן וחשבון על בדיקה מס' 7311508660



דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	כוח מופעל ב- KGF	מס' בורג	האלמנט הנבדק
נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 1,431	1	קטע קיר בטון לדוגמא רמפה כניסה לחניון
לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 1,500	2	
לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 1,500	3	
לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 1,500	4	
לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.	כ- 1,500	5	

שם הבודק: הנדסאי אלכסנדר גכטמן
תפקידו: טכנאי בודק
תאריך: 14/03/2023

תמונה של עוגן הנבדק

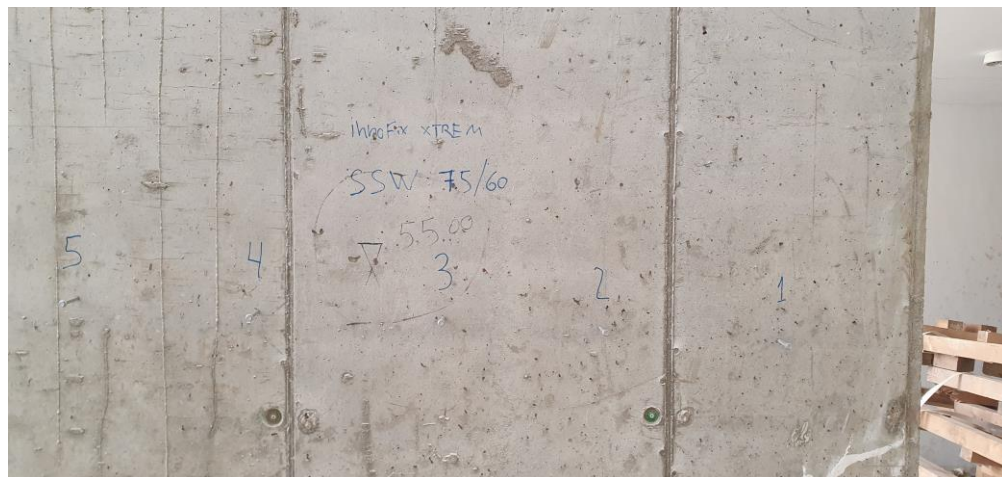

סוף דיווח
